Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.
DIAGRAMMA DI GANTT	87/124	23/01/2023	26/05/2023			
Allestimento cantiere	4/4	23/01/2023	26/01/2023			
Ponteggio metallico fisso	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	3	3
Accessi e circolazione mezzi in cantiere	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	1	1
Servizi igienici di cantiere	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	1	1
Impianto elettrico di cantiere	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	1	1
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	2	2
Deposito materiali cemento, laterizi e simili	4/4	23/01/2023	26/01/2023	1	1	1
Rimozione di canali e discendenti	1/1	27/01/2023	27/01/2023	1	3	3
Taglio di guaina impermeabilizzante	1/3	28/01/2023	30/01/2023	3	3	9
Demolizione di muratura a mano	6/8	31/01/2023	07/02/2023	3	3	9
Rinforzo con tessuti in fibra di carbonio	2/2	08/02/2023	09/02/2023	3	3	9
Realizzazione di ancoraggi a iniezione controllata	4/6	10/02/2023	15/02/2023	2	3	6
Manutenzione coperture	1/1	16/02/2023	16/02/2023	2	3	6
Muratura in mattoni pieni (ripresa testa tamburo)	7/11	17/02/2023	27/02/2023	3	3	9
Pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura	2/2	28/02/2023	01/03/2023	3	3	9
Ripresa intonaco esterno	4/6	02/03/2023	07/03/2023	3	3	9
Ripresa di lesioni con idonea malta (estradosso camminamento)	2/2	08/03/2023	09/03/2023	1	3	3
Rasatura con malta (estradosso camminamento)	2/4	10/03/2023	13/03/2023	3	3	9
Rimozione di opere in ferro (portale ingresso)	1/1	14/03/2023	14/03/2023	1	3	3
Demolizione di calcestruzzo ammalorato	2/2	15/03/2023	16/03/2023	3	3	9
Risarcitura di calcestruzzo ammalorato	5/7	17/03/2023	23/03/2023	3	3	9
Restauro di cornici	6/8	24/03/2023	31/03/2023	3	3	9
Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	1/1	03/04/2023	03/04/2023	1	3	3
Cuciture armate	1/1	04/04/2023	04/04/2023	2	3	6
Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	1/1	05/04/2023	05/04/2023	1	3	3
Ripresa membrana elastomerica (testa tamburo)	1/1	06/04/2023	06/04/2023	3	3	9
Impermeabilizzazione liquido su coperture	3/6	07/04/2023	12/04/2023	3	3	9
Tinteggiatura pareti esterne	3/5	13/04/2023	17/04/2023	3	3	9
Pulizia di paramenti murari con acqua a pressione	2/2	18/04/2023	19/04/2023	3	3	9
Restauro di elementi lignei o in pietra	4/7	20/04/2023	26/04/2023	3	3	9
Ripresa di lesioni con idonea malta	1/1	27/04/2023	27/04/2023	1	3	3
Riprese di lesioni in mattoni pieni	2/5	28/04/2023	02/05/2023	3	3	9
Taglio controsoffitto in cannuccia	1/1	03/05/2023	03/05/2023	1	3	3
Montaggio di strutture in acciaio (nuovi architravi)	1/1	04/05/2023	04/05/2023	2	3	6
Installazione impianto elettrico	1/1	05/05/2023	05/05/2023	3	3	9
Installazione apparecchiature elettriche	1/1	08/05/2023	08/05/2023	3	3	9
Installazione impianto luci	1/1	09/05/2023	09/05/2023	3	3	9
Intonaco interno deumidificante	2/2	10/05/2023	11/05/2023	3	3	9
Intonaco interno tradizionale manuale	2/4	12/05/2023	15/05/2023	3	3	9
Montaggio infissi interni	1/1	16/05/2023	16/05/2023	1	2	2
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	2/2	17/05/2023	18/05/2023	3	3	9
Levigatura di pavimenti interni	1/1	19/05/2023	19/05/2023	2	3	6
Ripresa lesioni scalinata in pietra	1/1	22/05/2023	22/05/2023	1	3	3
Smobilizzo cantiere	4/4	23/05/2023	26/05/2023			
Ponteggio metallico fisso	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	3	3
Accessi e circolazione mezzi in cantiere	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	1	1
Servizi igienici di cantiere	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	1	1
Impianto elettrico di cantiere	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	1	1
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	2	2
Deposito materiali cemento, laterizi e simili	4/4	23/05/2023	26/05/2023	1	1	1

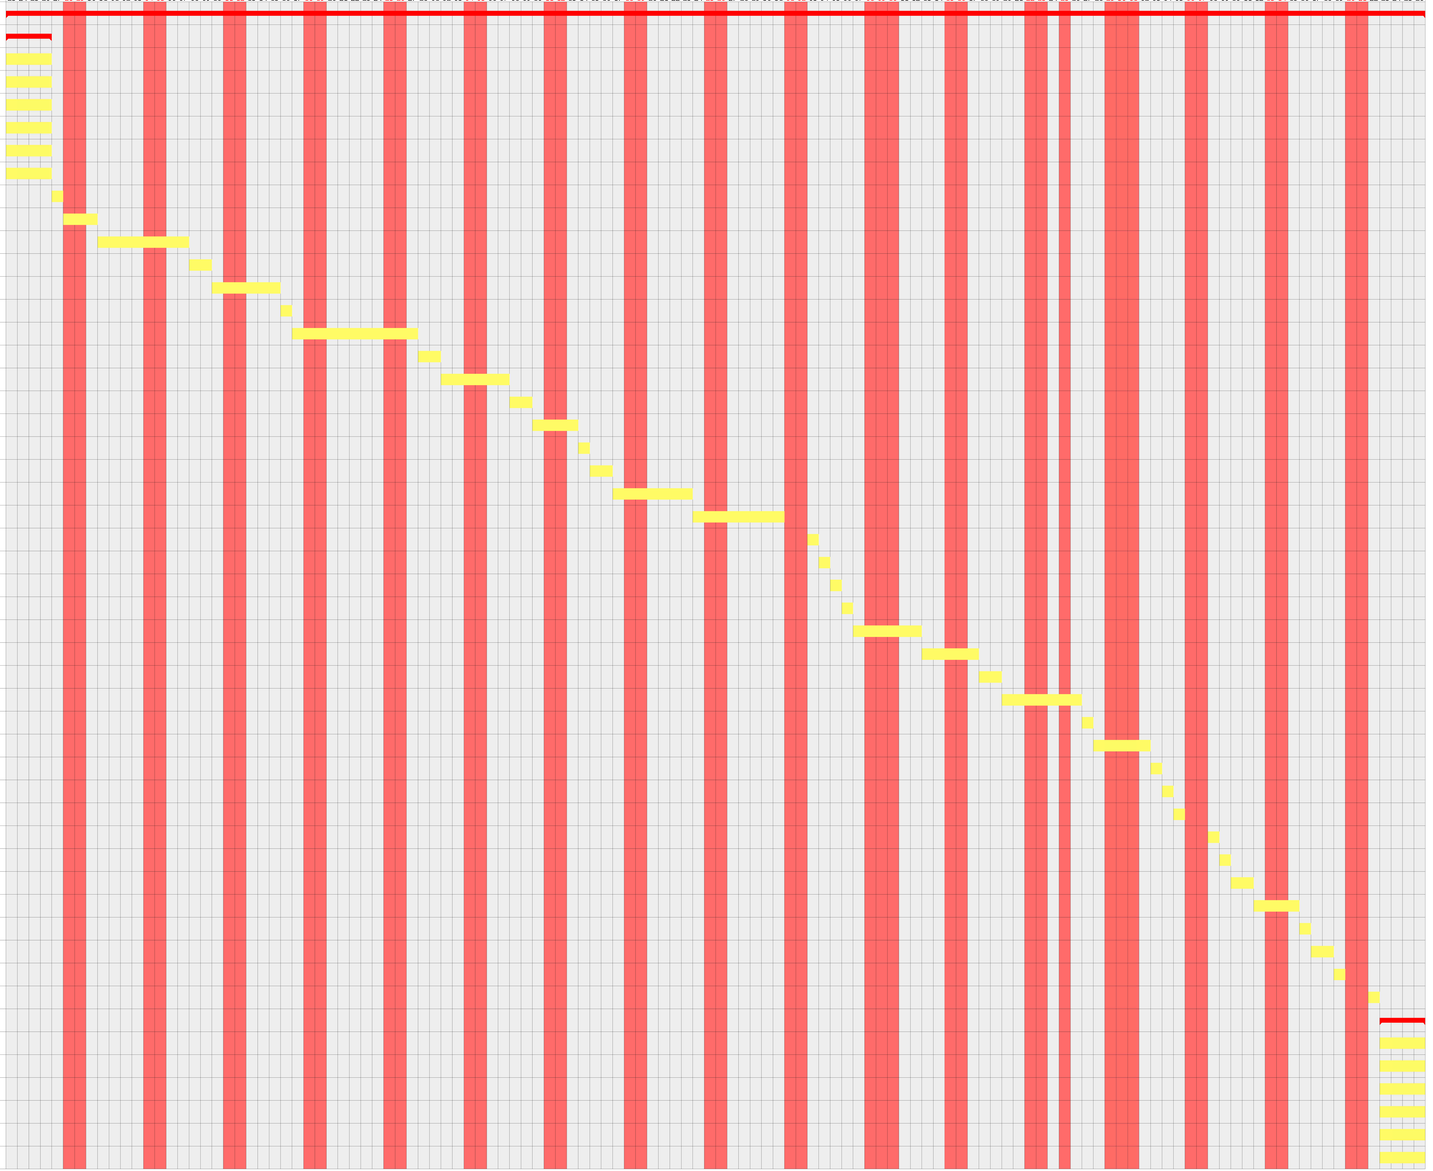

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO PRESSO IL CIMITERO DELLE TAVERNELLE - RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MONUMENTALE (FAMEDIO)

PROGETTO ESECUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI
CAPOGRUPPO
Ing. Marco LORENZINI
ALL INGEGNERIA
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

MANDANTI
Arch. Francesca Cocchioni
Arch. Pier Luigi Venanzi
META Consulting Progettazione s.r.l.
Via G. de Matteo n. 6 - 60131 - ANCONA - Tel. 071/2904001

Ing. Giorgio Orselli
Via R. Cadorna N° 2 - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN) - tel 335 8053660

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Jessica ANGELONI

elaborato

Progetto ESECUTIVO

Tipo	Spec.	n. tavola
E	V	012

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

scala :----

COMMESSA N° 457

cod. 457-E-V-012-A

Organizzazione certificata RINA secondo norma UNI EN ISO 9001 - Cert. n. 9104/0/S		DATA	DIPL.	CONTR.	APPR.
	emiss. A	21/12/22	EG	MP	ML
	1° rev. B				
	2° rev. C				
	3° rev. D				

Proprietà riservata, a termine di legge, a "ALL INGEGNERIA" con diretto di riproduzione e di utilizzazione anche solo parziale senza l'autorizzazione dell'autore.
